

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2017 по 30.11.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ "ЮЛУК" СЕЛА ЮЛУКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1150280037907
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Памятник - дедам, спортплощадка-внукам
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	17-1-003684

### Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Проведен анонс мероприятий на сайте и соц сетях села	05.09.2017	05.09.2017	исполнена	
2.	Составлен оптимальный вариант эскиза обелиска	07.09.2017	07.09.2017	исполнена	
3.	Уточнен список погибших в Великой отечественной войне и вернувшихся с победой	08.09.2017	08.09.2017	исполнена	
4.	Подготовлено место для закладки фундамента под обелиск в парке победы. Не менее 10 участников.	11.09.2017	11.09.2017	исполнена	
5.	Приобретена гранитная плита для обелиска со списком участников войны.	15.09.2017	26.09.2017	исполнена	Отказ от первого подрядчика
6.	Подготовлен фундамент для обелиска. Не менее 20	16.09.2017	16.09.2017	исполнена	

	участников.				
7.	Приобретены материалы для ограждения	16.09.2017	12.09.2017	исполнена	
8.	Огражден парк победы. Не менее 20 участников.	22.09.2017	22.09.2017	исполнена	
9.	Подготовлена место для спортплощадки. Не менее 30 участников	25.09.2017	25.09.2017	исполнена	
10.	Ограждена площадка для занятий спортом. Не менее 10 участников.	30.09.2017	30.09.2017	исполнена	
11.	Установлен обелиск-дань памяти поколений. Не менее 40 участников.	02.10.2017	02.10.2017	исполнена	
12.	Благоустроена территория обелиска. Не менее 20 участников	10.10.2017	10.10.2017	исполнена	
13.	Благоустроена спортплощадка. Не менее 50 участников.	14.10.2017	31.05.2018	исполнена частично	Из-за погодных условий некоторые работы необходимо выполнить в весенний период 2018 года
14.	Предоставлена молодежи возможность заниматься спортом. Не менее 50 участников.	15.10.2017	31.05.2018	исполнена частично	После полного благоустройства спортплощадки, май, июнь 2018 г.
15.	Открытие обелиска. Не менее 100 участников.	28.10.2017	28.10.2017	исполнена	
16.	Опубликованы отзывы в соц. сетях о проекте "Памятник - дедам, спортплощадка - внукам". Не менее 20 комментариев.	01.11.2017	30.11.2017	исполнена	
17.	Систематизирована информация об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла с. Юлуково.	20.11.2017	09.05.2018	исполнена частично	Продлен до 9 мая 2018 года
18.	Привлечена к общественной жизни участники ТОС. Не менее 50 участников.	30.11.2017	30.11.2017	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

*Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).*

Цель по благоустройству и установке обелиска, увековечивающего память об участниках в Великой отечественной войне и прилегающих к ним территорий достигнута. Уточнены списки погибших и вернувшихся живыми с Великой Отечественной войны. Установлен памятник из черного гранита участникам Великой Отечественной войны, ушедших на войну с с. Юлуково. Ограждена территория парка Победы евроштакетником длиной с лицевой стороны. Ограждена спортивная площадка для спортивных игр. Установлены турники для взрослых и для детей. Устроены скамейки для зрителей. Проект в целом реализован успешно.



**Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)**

*Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).*

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Составление эскиза обелиска	с 01.09.2017 по 30.09.2017	с 07.09.2017 по 07.09.2017	Составлен оптимальный вариант эскиза обелиска
Наименование количественного показателя				Значение
Нарисован эскиз памятника на стелах				4
2.	Закладка фундамента под обелиск	с 01.09.2017 по 30.09.2017	с 16.09.2017 по 16.09.2017	Подготовлен фундамент размером 3,20 метр на 0,8 метр.
Наименование количественного показателя				Значение
нет информации				0
3.	Приобретение материалов для ограждения спорт. Площадки	с 01.09.2017 по 30.09.2017	с 12.09.2017 по 12.09.2017	Подготовка к ограждению спортплощадки. Приобретены трубы НКТ, профильные трубы, сетка рабица, цемент, грунт-эмаль,.
Наименование количественного показателя				Значение
Приобретен комплект оборудования				1
4.	Ограждение спортивной площадки	с 01.09.2017 по 30.09.2017	с 30.09.2017 по 30.09.2017	Ограждена спортплощадка сеткой рабицей. Размер площадки 36 метр х 24 метр. С трех сторон высотой 3 метр, с одной стороны 1,5 метр.
Наименование количественного показателя				Значение
Площадка ограждена				1
5.	Уточнение списков участников Великой Отечественной войны с. Юлуково.	с 01.09.2017 по 30.09.2017	с 08.09.2017 по 08.09.2017	Уточнен список погибших и вернувшихся с победой
Наименование количественного показателя				Значение
Уточнены фамилии, имена участников ВОВ которые вернулись с победой				83
6.	Подготовка места установки обелиска	с 01.09.2017 по 30.09.2017	с 11.09.2017 по 11.09.2017	Подготовлено место для закладки фундамента в парке победы. Подготовлены доски для опалубки, завезены щебенка, песок.
Наименование количественного показателя				Значение
Место подготовлено				1
7.	Открытие обелиска	с 01.10.2017 по	с 28.10.2017 по	Установлен долгожданный жителями села Юлуково обелиск. Освещали


		29.10.2017	28.10.2017	мероприятие журналисты Башкирского спутникового телевидения (БСТ)
Наименование количественного показателя				Значение
В открытии приняло участие гостей и юлуковцев				100
8.	Установка обелиска	с 01.10.2017 по 29.10.2017	с 02.10.2017 по 02.10.2017	Установлен обелиск-дань памяти поколений, облицовка бессер блоками и керамической плитой.
Наименование количественного показателя				Значение
Установлены стелы				4
9.	Первые соревнования по мини футболу	с 01.10.2017 по 29.10.2017	с 22.06.2018 по 22.06.2018	Первые игры, соревнования отложены на май, июнь 2018 г. из-за вспашки спортплощадки под газону траву.
Наименование количественного показателя				Значение
нет информации				0
10.	Приобретение гранитной плиты к обелиску	с 01.09.2017 по 30.10.2017	с 26.09.2017 по 26.09.2017	Приобретена гранитная плита для обелиска со списком участников войны
Наименование количественного показателя				Значение
Приобретено гранитных плит со списком				4
11.	Благоустройство территории	с 01.10.2017 по 31.10.2017	с 10.10.2017 по 10.10.2017	Ограждена территория парка. Выравнивание земли на парке Победы. Вспашка земли трактором на сортплощадке под газонную траву. Ограждена территория парка евроштакетником по лицевой стороне длиной 84 м. Выровнена территория парка засыпкой песком, лопатами. Вспахана трактором спортивная площадка под газонную траву
Наименование количественного показателя				Значение
В субботнике поучаствовало человек				55
12.	Сбор материала об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла с. Юлуково.	с 01.09.2017 по 30.11.2017	с 01.09.2017 по 09.05.2018	Систематизируется информация об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла с. Юлуково.
Наименование количественного показателя				Значение
Оцифрована тетрадь воспоминаний Ишмуззина Самигуллы А. о ветеранах которые вернулись с ВОВ				1

<b>Электронные ссылки на публикации и(или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в</b>	<a href="https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/617191/">https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/617191/</a> ; <a href="http://ufa.bezformata.ru/listnews/yuluk-pamyatnik-dedam-sportploshadka/60370913/">http://ufa.bezformata.ru/listnews/yuluk-pamyatnik-dedam-sportploshadka/60370913/</a> ; <a href="http://zvezda-gafuri.ru/journal/events/sportploschadka_detyam/">http://zvezda-gafuri.ru/journal/events/sportploschadka_detyam/</a> ; <a href="http://yulukovo.ucoz.ru/news/tos_juluk_pobeditel_konkursov_na_predostavlenie_grantov_prezidenta_rossijskoj_federacii_na_razvitie_grazhdanskogo_obshestva/2017-08-05-34/">http://yulukovo.ucoz.ru/news/tos_juluk_pobeditel_konkursov_na_predostavlenie_grantov_prezidenta_rossijskoj_federacii_na_razvitie_grazhdanskogo_obshestva/2017-08-05-34/</a> ; <a href="http://">http://</a>
--	---

<p><b>средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p><a href="http://yulukovo.ucoz.ru/news/pamjatnik_veteranam_velikoj_otchestvennoj_vojny_oni_vernulis_s_pobedoj/2017-11-10-36">//yulukovo.ucoz.ru/news/pamjatnik_veteranam_velikoj_otchestvennoj_vojny_oni_vernulis_s_pobedoj/2017-11-10-36</a>; <a href="http://tv-rb.ru/novosti/society/gafuriysky_district_has_established_a_memorial_for_the_veterans_of_the_great_patriotic_war/">http://tv-rb.ru/novosti/society/gafuriysky_district_has_established_a_memorial_for_the_veterans_of_the_great_patriotic_war/</a>; <a href="http://tv-rb.ru/bash/novosti/y-m-i-t/ata-babalar-a-yk-l-balalar-a-sport-may-ansy-y/">http://tv-rb.ru/bash/novosti/y-m-i-t/ata-babalar-a-yk-l-balalar-a-sport-may-ansy-y/</a>; <a href="https://vk.com/yulukovo">https://vk.com/yulukovo</a></p>											
<p><b>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p><b>Мероприятие:</b> Открытие обелиска</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="757 443 1245 772">  <p>11. Открытие обелиска, 28.10. 2017 г. РБ Гафурийский район, с. Юлуково</p> </div> <div data-bbox="1406 443 1895 772">  <p>11. Открытие обелиска, 28.10.2017 г. РБ Гафурийский район, с. Юлуково</p> </div> </div>											
<p><b>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</b></p>	9											
<p><b>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Название</th> <th style="width: 45%;">Описание</th> <th style="width: 20%;">Файл</th> <th style="width: 10%;">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата									

**Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)**

*Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта [оценка.гранты.рф](http://оценка.гранты.рф) (в том числе для представителей СМИ).*

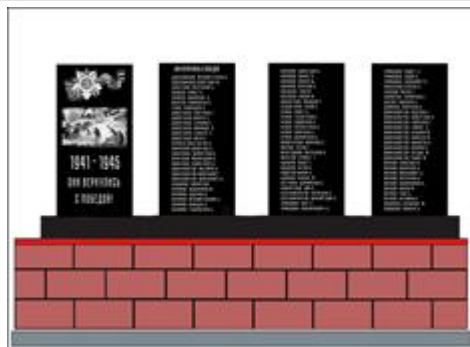

3. Составление эскиза обелиска



6. Закладка фундамента под обелиск, 15.09.2017 г  
РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а



3. Составление эскиза обелиска.



6. Закладка фундамента под обелиск, 15.09.2017 г.  
РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а



Частично реставрирован установленный 1986 году

<p>4. Приобретение гранитной плиты к обелиску. 30.09.2017 г РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а</p>	<p>памятник участникам Великой Отечественной войны, не в</p>
 <p>8. Ограждение спортивной площадки, 1.10.2017 г. РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а</p>	 <p>8. Ограждение спортивной площадки, 11.10.2017 г РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а</p>
 <p>8. Ограждение спортивной площадки, 11.10.2017 г. РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а</p>	 <p>8. Ограждение спортивной площадки. 11.10.2017 г РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а</p>
	 <p>10. Благоустройство территории, турник, скамейки. 11.10.2017 г. Стадия благоустройства. РБ Гафурийский</p>

	<p>8. Ограждение спортивной площадки, 11.10.2017 г РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а</p>  <p>10. Благоустройство территории, ограждение парка. Готов. 11.10.2017 г. Проект реализован. РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а</p>	район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а
<b>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта финансировании (за весь срок осуществления проекта)</b>	Объем софинансирования 40000 рублей. Израсходовано на ограждение территории парка Победы и с тыла сеткой по длине 35 метр, высотой 1,5 метр, вывески, услуги автомобилей, трактора, ГСМ, обновление старого обелиска, строительные материалы, расходные материалы, зарплата. В том числе: Статья 100. Дополнительно выплата физическим лицам за услуги– 22000 рублей Статья 400. Приобретены строительные материалы, расходные материалы, ГСМ на сумму 12000 рублей, 6000 рублей оставлено на дальнейшее развитие проекта в 2018 году.	
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс. руб.)</b>	40,00	

### Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта [оценка.гранты.рф](http://оценка.гранты.рф) (в том числе для представителей СМИ).

<b>а) Количественные результаты</b>	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	400
	Установлен обелиск участникам Великой отечественной войны - вернувшимся живыми	83
	установлены стеллы	4
<b>б) Качественные результаты</b>	Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта: - Начата систематизация информация об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла с. Юлуково; - Уточнены списки участников Великой Отечественной войны. Всего участвовало 190 человек, из них погибли на фронте	



	107 человек, вернулись – 83; - Ограждена площадка для занятий спортом 36 метр x 24 метр. С трех сторон высотой 3 метр, с одной стороны 1,5 метр; - Установлен долгожданный жителями села Юлуково обелиск участникам Великой отечественной войны - вернувшимся живыми. В четырех стенах выгравированы 83 фамилий; - реализация проекта «Памятник - дедам, спортплощадка - внукам» позволило повысить духовное, патриотическое и физическое воспитание подрастающих юлуковцев; - создается условия для занятия различными видами спорта и формами проведения досуга для всех категорий жителей села, прежде всего, молодежи. - создан единый комплекс, где можно было бы организовать развивающую среду для жителей села.			
<b>Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта</b>	- Результаты проекта направлены на все слои населения села; - Продолжительность влияния на целевую группу неограничено; - Реализация проекта позволит повысить духовное, патриотическое и физическое воспитание подрастающего поколения; - Цели проекта достигнуты.			
<b>Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта</b>	Ограждена тыльная сторона парка Победы, изготовлены вывески, частично реставрирован памятник участникам войны которые не вернулись с войны.			
<b>Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</b>	В планировании календарного плана: соревнования по мини футболу невозможно провести в конце октября. В планировании бюджета в статье приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы: расходы на приобретение гранитных плит для обелиска излишними, а на строительные материалы для ограждения недостаточными."			
<b>Общие выводы по результатам реализации проекта</b>	"Факторы успешной реализации проекта: - четко поставленные цели; - квалифицированная команда.; - достаточное ресурсное обеспечение; - обратная связь."			
<b>Дополнительные документы</b>	Название	Описание	Файл	Дата
	10. Благоустройство территории, ограждение парка. Готов.	11.10.2017 г. Проект реализован. РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а	17-1-003684 16.JPG	04.07.2019
	10. Благоустройство территории, ограждение парка. Готов.	11.10.2017 г. Перед открытием памятника. РБ Гафурийский район, с. Юлуково, ул. М. Гафури, 2а	17-1-003684 17.JPG	04.07.2019
<b>Рекомендации по развитию грантового конкурса</b>				
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Фамилия, имя и отчество: Юлуков Рахимьян Шакирьянович			
<b>Основания полномочий лица, подписывающего отчетность</b>	Отчет подписан на основании Устава			

**Дополнительная информация**

<b>Количество благополучателей проекта</b>	750
--	-----

	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество
	Все слои населения	Жители села Юлуково	750
<b>Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта</b>	30		
<b>Наличие и характер уникальных результатов проекта</b>	Повысился интерес к истории родного края как взрослых так и молодежи; Привлечена молодежь и подростки к занятиям спортом; В результате реализации проекта центральная часть села приобрела современный благоустроенный вид.		
<b>Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)</b>	1030		
<b>Ссылка</b>	<a href="https://vk.com/yulukovo">https://vk.com/yulukovo</a>		
<b>Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта</b>	Проводятся тренировочные игры и соревнования по футболу, хоккею с шайбой. Жители села посещают парк Победы.		
<b>Дополнительные документы</b>	Название	Описание	Дата
